

Ситуационный центр
Система управления регионом
Проект «Наши дворы»
Инструкция пользователя

Содержание

1.	Принятые термины и сокращения	2
2.	Начало работы	2
3.	Навигация по страницам	3
4.	Просмотр дашбордов	3
5.	Дашборд «Проект «Наши дворы»	4
5.1.	Структура проекта	9
5.2.	Вкладка «Проекты».....	10
5.3.	Вкладка «Выполнение»	11
5.4.	Вкладка «Проекты на совещание»	12
5.5.	Вкладка «Ход реализации»	13
5.5.1.	Разработка ПСД.....	14
5.5.2.	Получение заключения	16
5.5.3.	Конкурсные процедуры.....	17
5.5.4.	Заключение контракта	19
5.5.5.	Выполнение работ.....	20
5.6.	Вкладка «Оплата»	22
5.7.	Вкладка «Детализация по оплате»	22
5.8.	Вкладка «Этапы».....	23
5.9.	Вкладка «Контрольные точки».....	25
5.10.	Вкладка «Общая информация».....	27
5.11.	Вкладка «Камеры»	28
5.12.	Вкладка «Проект»	29
6.	Техническая поддержка.....	30

1. Принятые термины и сокращения

Таблица 1

№ п.п.	Сокращение, термин	Расшифровка
1	ГБУ ЯО «Электронный регион»	Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Электронный регион»
2	ГО	Городской округ
3	МО	Муниципальное образование, муниципальный округ
4	РИАС ЯО	Региональная информационно-аналитическая система Ярославской области
5	МКП	Министерство конкурентной политики
6	МРР ЯО	Министерство регионального развития Ярославской области
7	ПСД	Проектно-сметная документация
8	Система, СЦ	Ситуационный центр
9	СУР	Система управления регионом
10	ЦКПМ	ГКУ ЯО «Центр конкурентной политики и мониторинга»
11	ЯО	Ярославская область

2. Начало работы

Для входа в Ситуационный центр (далее – Система) необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запустить браузер. Открыть страницу входа в Систему по ссылке <http://sc.yarcloud.ru>.
2. В открывшемся окне (Рисунок 1) ввести учетные данные пользователя.

Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя

3. Нажать кнопку «Вход».
4. При ошибке данных авторизации отобразится сообщение «Неправильное имя пользователя или пароль». В этом случае необходимо проверить данные и повторить ввод.
5. После успешной аутентификации будет отображена главная страница (Рисунок 2).

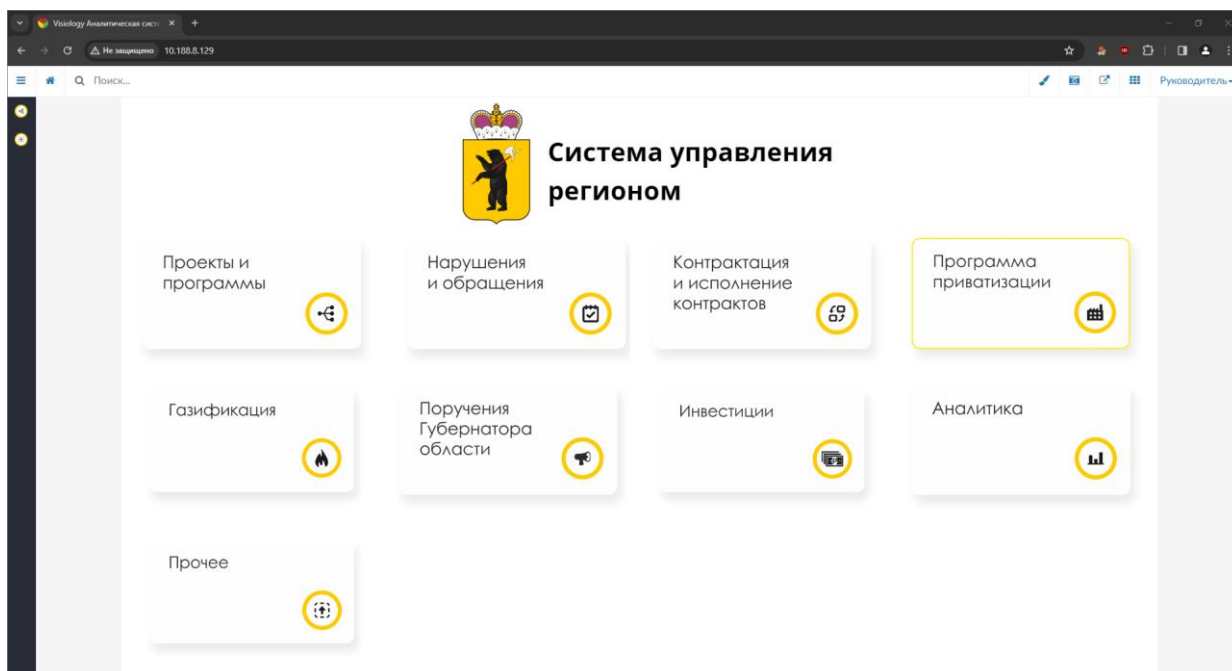


Рисунок 2 – Главная страница Системы

3. Навигация по страницам

Главная страница Системы содержит меню с пунктами – разделами, а также боковую панель.

При переходе в конкретный раздел пользователь имеет возможность воспользоваться дашбордами данного раздела.

Для навигации по разделам и дашбордам можно использовать боковую панель, расположенную в левой области главной страницы.

Также для перехода к необходимому дашборду можно воспользоваться строкой поиска: ввести часть названия дашборда в поле «Поиск» (см. Рисунок 3).




Рисунок 3 – Строка поиска

4. Просмотр дашбордов

Перейти к дашборду «Проект «Наши дворы» можно несколькими способами:

1. Выбрать пункт меню «Проекты и программы» или ярлык в боковой панели



Выбрать дашборд «Проект «Наши дворы» (Рисунок 4).

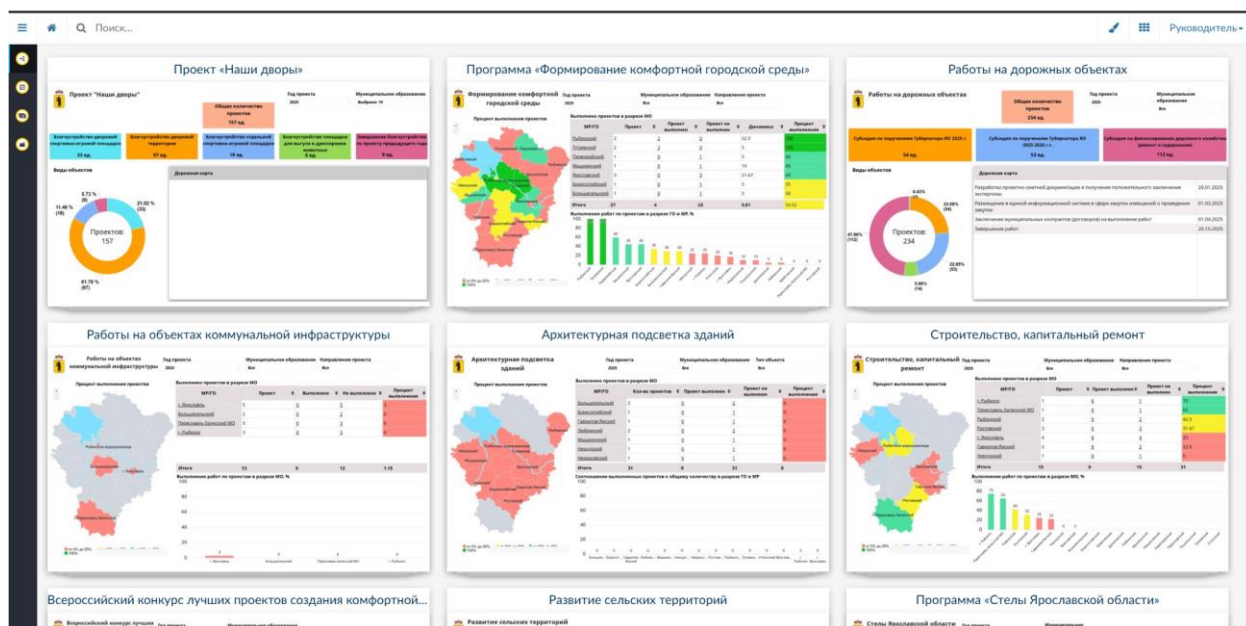


Рисунок 4 – Макеты дашбордов

2. Указать подстроку наименования дашборда в строке поиска (см. Рисунок 3).

5. Дашборд «Проект «Наши дворы»

Источником данных для дашборда является подсистема «Программа «Наши дворы» РИАС ЯО.

Дашборд «Проект «Наши дворы» (Рисунок 5) содержит таблицы и диаграммы по разделу «Проект «Наши дворы», сгруппированные по вкладкам:

- Структура проекта;
- Проекты;
- Выполнение;
- Проекты на совещание;
- Ход реализации;
- Оплата;
- Детализация по оплате;
- Этапы;
- Контрольные точки;
- Общая информация;
- Камеры;
- Проект.

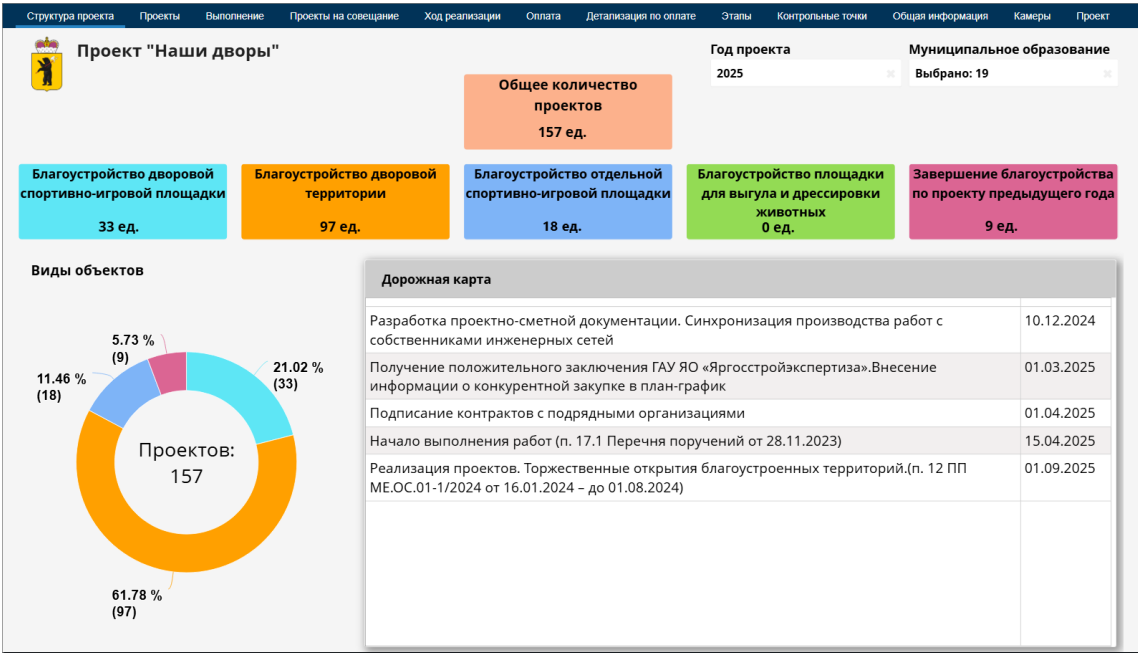


Рисунок 5 – Дашборд

Краткое описание вкладок дашборда указано в таблице (Таблица 2).

Таблица 2

№ п.п.	Наименование вкладки	Состав информации	Краткое описание	Переход на другую вкладку
1	Структура проекта	Диаграмма «Виды объектов» Дорожная карта	Отображение сведений по количеству и процентному соотношению по типам проектов Дорожная карта проекта «Наши дворы» Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, муниципальное образование Основная вкладка	Возможность перехода на вкладку «Проекты» по нажатию на панель с показателем
2	Проекты	Диаграмма «Процент выполнения проектов»; Таблица «Выполнение работ в разрезе МО»; Диаграмма «Выполнение работ по проектам в разрезе МО, %»	Отображение сведений по выполнению проектов в разрезе муниципальных образований. Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, год ассигнований, муниципальное образование, тип проекта, дата динамики Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по ссылке на МО/ГО на вкладку «Выполнение» для просмотра сведений по проектам выбранного МО/ГО Возможность перехода по

				ссылкам на значение в таблице на вкладку «Выполнено»
3	Выполнение	Таблица «Выполнение работ»; Диаграмма «Исполнение проектов»	Отображение сведений по выполнению проектов. Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, год ассигнований, муниципальное образование, тип проекта, этап проекта, дата динамики Может быть использована и как основная, и как детализация для вкладок «Проекты», «проекты на совещание», «Ход реализации», «Этапы», «Контрольные точки»	Возможность перехода из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра сведений по выбранному проекту
4	Проекты на совещание	Таблица «Выполнение работ»	Отображение сведений по выполнению проектов, выбранных при подготовке к совещанию МРР ЯО Отображение количества выбранных проектов по МО Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, год ассигнований, муниципальное образование, тип проекта, этап проекта, дата динамики Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра сведений по выбранному проекту
5	Ход реализации	Диаграмма «Исполнение проектов» Таблица «Выполнение работ» Диаграмма «Процент реализации в разрезе МО, %»	Отображение сведений по реализации проектов в разрезе муниципальных образований. Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, год ассигнований, муниципальное образование, тип проекта, контрольная точка Контрольные точки:	Возможность перехода из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра сведений по выбранному проекту

			Разработка ПСД Получение заключения Конкурсные процедуры Заключение контракта Выполнение работ Основная вкладка	
6	Оплата	Таблица по стоимостным показателям в разрезе муниципальных образований; Диаграмма «Кассовое исполнение»	Отображение сведений по стоимостным показателям и кассовому исполнению. Возможность фильтрации параметрам: год проекта, год ассигнований, муниципальное образование, тип проекта Основная вкладка	Возможность перехода из таблицы по ссылке на наименование МО/ГО на вкладку «Детализация по оплате»
7	Детализация по оплате	Таблица «Детализация по оплате»	Отображение сведений по оплате в разрезе проектов. Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, год ассигнований, муниципальное образование, тип проекта. Может быть использована и как основная, и как детализация для вкладки «Оплата».	Возможность перехода из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект»
8	Этапы	Таблица «Этапы выполнения проектов»; Диаграмма «Количество проектов по этапу»	Отображение сведений по количеству проектов в разрезе этапов и муниципальных образований Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, год ассигнований, муниципальное образование, этап проекта, тип проекта. Основная вкладка.	Возможность перехода из таблицы по ссылке на МО/ГО на вкладку «Выполнение»
9	Контрольные точки	Таблица по выполнению контрольных точек	Сведения по этапам выполнения проекта в разрезе муниципальных образований	Возможность перехода из таблицы по ссылке на МО/ГО и на

			Возможность фильтрации по году проекта, году ассигнований, муниципальным образованиям, типу проекта, контрольным точкам (этапам проекта) Основная вкладка	значение на вкладку «Выполнение»
10	Общая информация	Диаграмма «Количество проектов»; Таблица с перечнем проектов	Отображение сведений по количеству проектов по муниципальным образованиям Отображение перечня проектов Возможность фильтрации по параметрам: год проекта, год ассигнований, этап, муниципальное образование, тип проекта Основная вкладка.	Возможность перехода из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект»
11	Камеры	Показатели оснащения и исправности СВН	Количество объектов, оснащенных и неоснащенных СВН, диаграмма Сведения о количестве камер и их исправности на объектах Возможность фильтрации по году проекта, муниципальному образованию, этапу, типу проекта Возможность выбора проекта по коду, наименованию, адресу, наличию видеопотока с камер	Возможность перехода из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект»
12	Проект	Карточка проекта	Отображение информации по проекту (включая сведения по контрактам, контрольным точкам, финансированию, фотоматериалы)	Возможность перехода на Геопортал для просмотра карточки объекта с фото до реализации, в процессе, после

			Используется как детализация для вкладок «Выполнение», «Проекты на совещании», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Камеры»	реализации, видеокамер
--	--	--	--	------------------------

5.1. Структура проекта

Вкладка предназначена для отображения сведений по структуре губернаторского проекта «Наши дворы» на указанный год. (Рисунок 5).

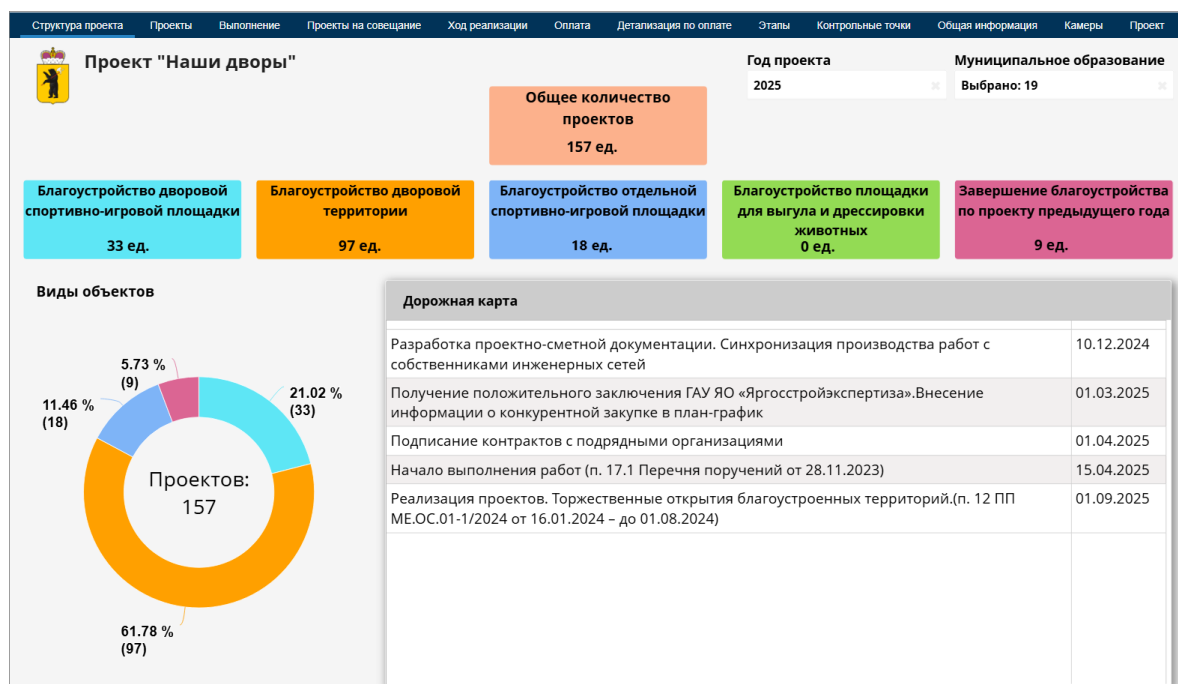


Рисунок 5 – Вкладка «Структура проекта»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Муниципальное образование».

Для того, чтобы воспользоваться фильтром, нужно нажать фильтр, выбрать нужное значение (значения – в случае функции множественного выбора на фильтре), нажать кнопку «Применить». После этого данные на вкладке, на которые влияет фильтр, перестроятся в соответствии с выбранными значениями в фильтре.

Элементы вкладки:

- Блоки показателей количества проектов по типам проектов;
- Диаграмма «Виды объектов»;
- Дорожная карта.

Блоки показателей и диаграмма предназначены для отображения количества и процентного соотношения проектов различных типов.

Предусмотрен переход с блока с показателем количества проектов по типу на вкладку «Проекты».

5.2. Вкладка «Проекты»

Вкладка предназначена для отображения сведений по выполнению проектов в разрезе муниципальных образований (Рисунок 6).

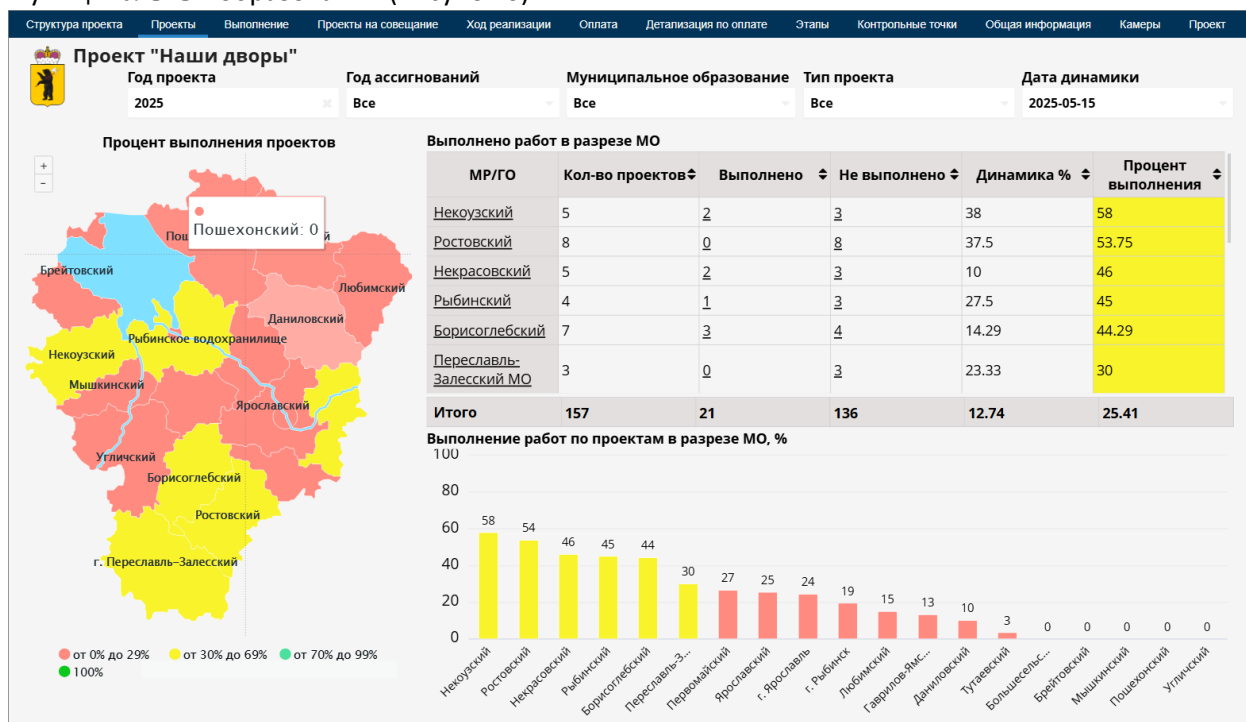


Рисунок 6 – Вкладка «Проекты»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Год ассигнований», «Муниципальное образование», «Тип проекта», «Дата динамики» для управления отображением данных.

Работа с фильтром описана в п. 4.1.

Фильтр «Дата динамики» предназначен для выбора даты, относительно которой необходимо показать динамику. Перечень дат динамики формируется сотрудником МРР ЯО в РИАС ЯО.

Элементы вкладки:

- Диаграмма «Процент выполнения проектов»;
- Таблица «Выполнение работ в разрезе МО»;
- Диаграмма «Выполнение работ по проектам в разрезе МО, %».

Диаграмма «Процент выполнения проектов» предназначена для отображения данных по проценту выполнения на карте региона. При наведении мыши на область муниципального образования отображается значение показателя.

Таблица «Выполнение работ в разрезе МО» предназначена для отображения показателей по выполнению проектов. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на МО/ГО на вкладку «Выполнение» для просмотра детализированной информации - сведений по проектам выбранного МО/ГО. Предусмотрен переход по ссылкам на значение в таблице «Выполнено», «Не выполнено» на вкладку «Выполнение».

Таблица 3

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход
1	МО/ГО		Предусмотрен переход на вкладку «Выполнение»

2	Кол-во проектов	Общее количество проектов с применением фильтров	
3	Выполнено	Количество проектов на этапе «Работы фактически завершены» и «Работы завершены»	Предусмотрен переход на вкладку «Выполнение»
4	Не выполнено	[2]-[3]	Предусмотрен переход на вкладку «Выполнение»
5	Динамика %	Изменение [6] относительно выбранной в фильтре «Дата динамики» даты	
6	Процент выполнения	Средний процент выполнения проектов по МО/ГО	

Диаграмма «Выполнение работ по проектам в разрезе МО, %» предназначена для отображения значений показателя «Процент выполнения проектов» по МО/ГО.

Для таблицы и диаграмм предусмотрена цветовая индикация:

- От 0% до 29% - красный,
- От 30% до 69% - желтый,
- От 70% до 99% - салатовый,
- 100% - зеленый.

5.3. Вкладка «Выполнение»

Вкладка предназначена для отображения сведений по выполнению проектов (Рисунок 6).

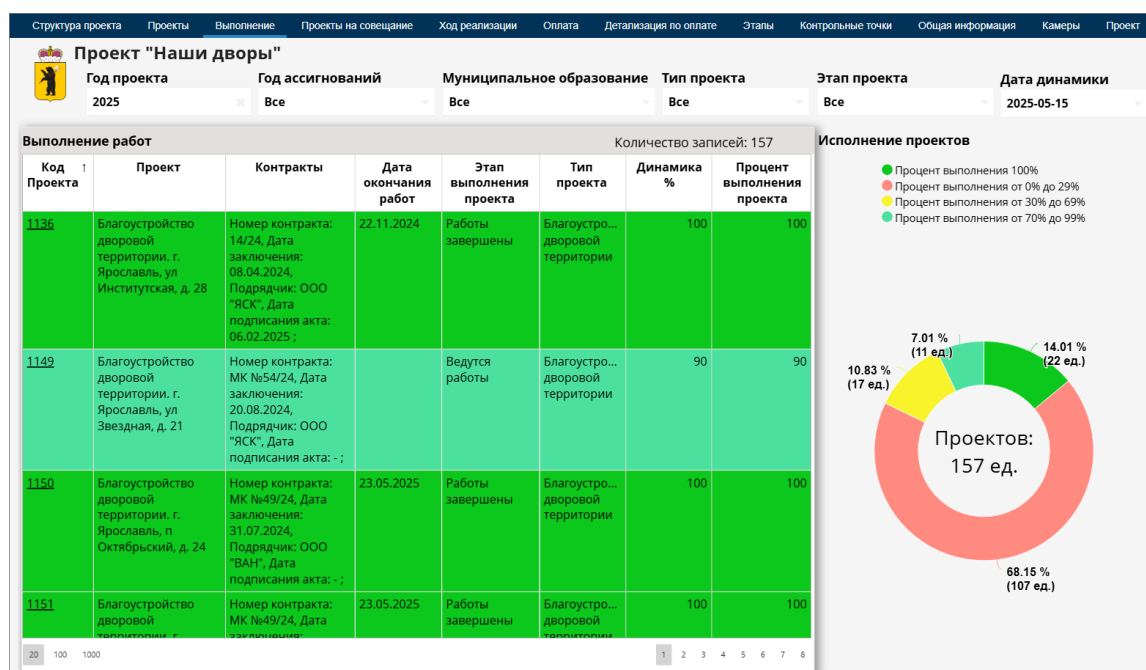


Рисунок 7 – Вкладка «Выполнение»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Год ассигнований», «Муниципальное образование», «Тип проекта», «Этап проекта», «Дата динамики» для управления отображением данных. Работа с фильтрами описана в п. 4.1.

Фильтр «Дата динамики» предназначен для выбора даты, относительно которой необходимо показать динамику. Перечень дат динамики формируется сотрудником МРР ЯО в РИАС ЯО.

Рисунок 8 – Вкладка «Проекты на совещание»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Год ассигнований», «Муниципальное образование», «Тип проекта», «Этап проекта», «Дата динамики» для управления отображением данных. Работа с фильтрами описана в п. 4.1.

Фильтр «Дата динамики» предназначен для выбора даты, относительно которой необходимо показать динамику. Перечень дат динамики формируется сотрудником МРР ЯО в РИАС ЯО.

Элементы вкладки:

- Таблица «Выполнение работ»;
- Таблица по количеству выбранных проектов в разрезе МО.

Таблица «Выполнение работ» предназначена для отображения сведений по выполнению проектов. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации - сведений по выбранному проекту и контрактам.

Для таблицы предусмотрена цветовая индикация:

- От 0% до 29% - красный,
- От 30% до 69% - желтый,
- От 70% до 99% - салатовый,
- 100% - зеленый.

Таблица по количеству выбранных проектов показывает количество выбранных проектов в разрезе муниципальных образований и предназначена для управления отображением проектов в таблице «Выполнение работ». При выборе графы с наименованием муниципального образования в таблице «Выполнение работ» будут показаны проекты соответствующего муниципального образования. При выборе графы «Выбрано проектов:» в таблице «Выполнение работ» будут показаны все проекты из перечня подготовленных к совещанию.

Структура проекта Проекты Выполнение Проекты на совещание Ход реализации Оплата Детализация по оплате Этапы Контрольные точки Общая информация Камеры Проект										
Проект "Наши дворы" Год проекта Год ассигнований Муниципальное образование Тип проекта Этап проекта Дата динамики 2025 Все Все Выбрано: 5 Все 2025-05-15										
Выбрано проектов: 23 Выполнение работ										
г. Ярославль	9	МР / ГО	Код Проекта	Проект	Контракты	Дата окончания	Этап выполнения	Тип проекта	Динамика %	Процент выполнения
Некоузский	4	Некоузский	1972	Завершение благоустройства по проекту предыдущего года, поставка и установка оборудования (ограждение) по адресу: улица Центральная, у д.6, с. Марьино, Некоузского района, Ярославской области	Номер контракта: 17-2025, Дата заключения: 27.01.2025, Подрядчик: ООО "Техком", Дата подписания акта: 15.05.2025 ;	30.05.2025	Работы завершены	Завершение благоустройства по проекту предыдущего года	100	100
Угличский	3	Некоузский	2008	Благоустройство дворовой территории. Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д.1, д.2	Номер контракта: 017120000192500131... Дата заключения: 23.04.2025, Подрядчик: АО Ярдормост, Дата подписания акта: - ;		Ведутся работы	Благоустройство дворовой территории	90	90
Рыбинский	2	Некоузский	1959	Благоустройство отдельной спортивно-игровой площадки, Некоузский р-н, с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, д.29	Номер контракта: 017120000192500144... Дата заключения: 30.04.2025, Подрядчик: ООО "ПК Крепыш", Дата подписания акта: - ;		Заключен муниципальн... контракт	Благоустройство отдельной спортивно-игровой площадки	0	0
Брейтовский	1	Некоузский	2024	Благоустройство дворовой территории: с. Новый Некоуз ул. Юбилейная, д.29	Номер контракта: 017120000192500173... Дата заключения: 23.05.2025, Подрядчик: - ;		Заключен муниципальн... контракт	Благоустройство дворовой территории	0	0
Любимский	1									
Пошехонский	1									
Ростовский	1									
Тутаевский	1									

Рисунок 9 – Вкладка «Проекты на совещание». Выбор по МО/ГО

5.5. Вкладка «Ход реализации»

Вкладка предназначена для отображения сведений по реализации проектов в разрезе муниципальных образований (Рисунок 10).

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Год ассигнований», «Муниципальное образование», «Тип проекта», «Контрольная точка» для управления отображением данных. Работа с фильтрами описана в п. 4.1.

Фильтр «Контрольные точки» содержит следующие элементы:

- Разработка ПСД;
- Получение заключения;
- Конкурсные процедуры;
- Заключение контракта;
- Выполнение работ.

Сведения по выполнению этапов работ сгруппированы по контрольным точкам.

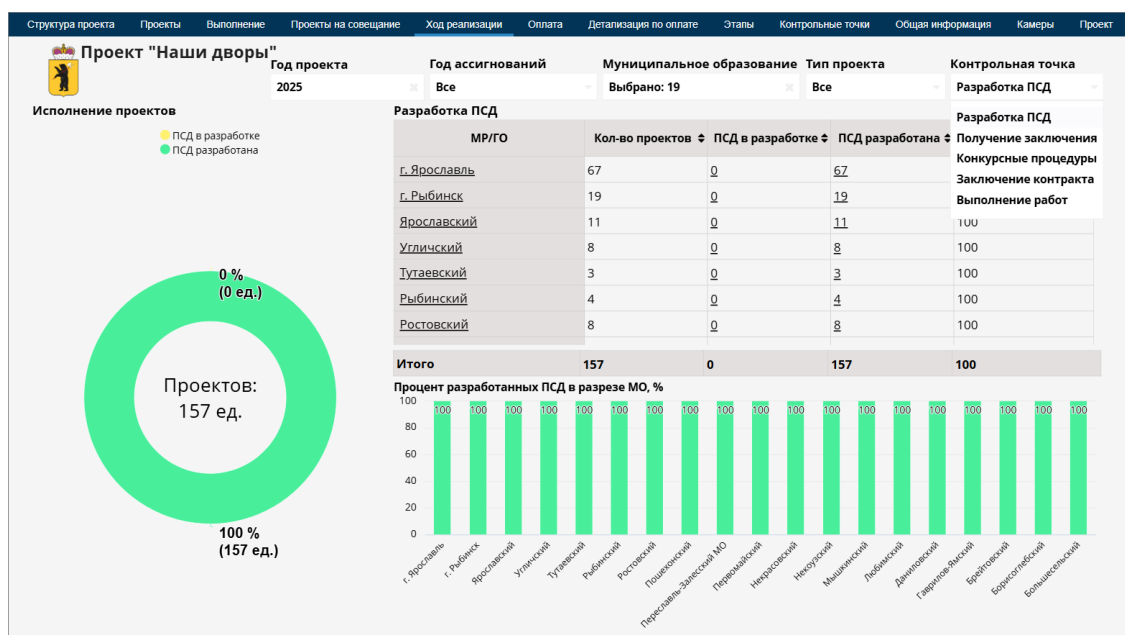


Рисунок 10 – Вкладка «Ход реализации»

Элементы вкладки:

- Диаграмма сведений по исполнению проектов по контрольной точке;
- Таблица сведений по исполнению работ в разрезе МО;
- Диаграмма выполнения работ по проектам в разрезе МО, %».

5.5.1. Разработка ПСД

Вид вкладки представлен на рисунке 11.

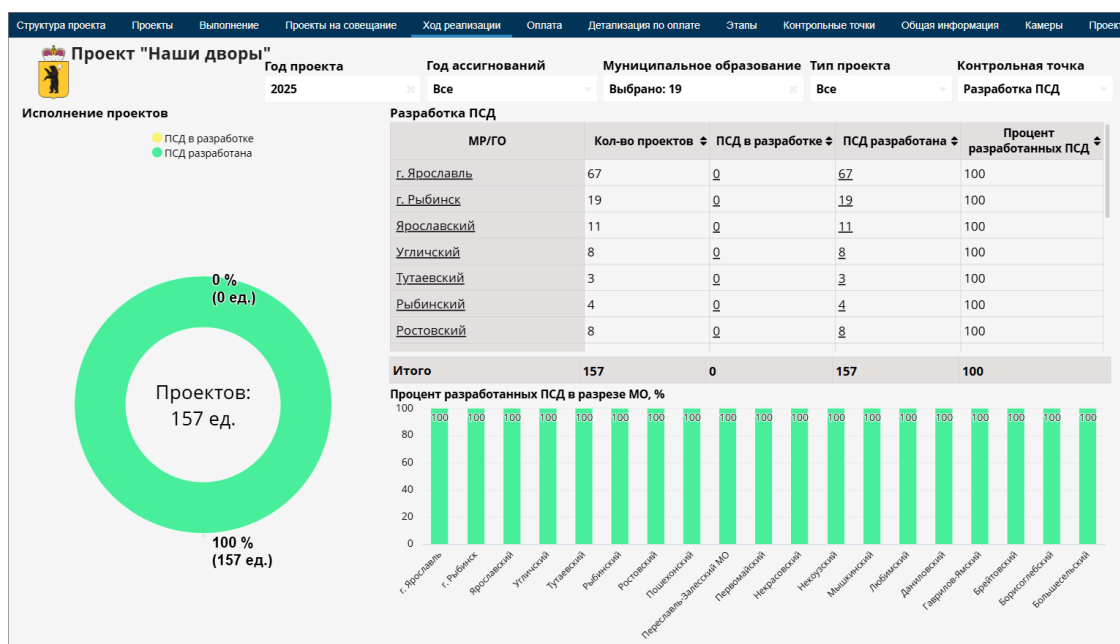


Рисунок 11 – Вкладка «Ход реализации». Разработка ПСД

Элементы вкладки:

- Диаграмма «Исполнение проектов»;
 - Таблица «Разработка ПСД»;
 - Диаграмма «Процент разработанной ПСД в разрезе МО, %».
- Описание таблицы «Разработка ПСД» указано в таблице.

Таблица 4

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МО/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	ПСД в разработке	Количество проектов на этапе «ПСД в разработке»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	ПСД разработана	Количество проектов на этапах «ПСД разработана» «ПСД на экспертизе» «Получено положительное заключение экспертизы» «Документы направлены в ДГЗ/ЦКПМ» «Объявлены конкурсные процедуры» «Повторные конкурсные процедуры» «Закупка не состоялась» «Закупка состоялась» «Заключен муниципальный контракт» «Ведутся работы» «Работы фактически завершены» «Работы завершены»	Переход на вкладку «Выполнение»

5	Процент разработанных ПСД	$[4]/[2]*100\%$	
---	---------------------------	-----------------	--

Диаграмма «Процент разработанной ПСД в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент разработанных ПСД» таблицы «Разработка ПСД».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Разработка ПСД». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице.

Таблица 5

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	[2]+[3]
2	ПСД в разработке	Количество проектов на этапе «ПСД в разработке»
3	ПСД разработана	Количество проектов на этапах «ПСД разработана» «ПСД на экспертизе» «Получено положительное заключение экспертизы» «Документы направлены в ДГЗ/ЦКПМ» «Объявлены конкурсные процедуры» «Повторные конкурсные процедуры» «Закупка не состоялась» «Закупка состоялась» «Заключен муниципальный контракт» «Ведутся работы» «Работы фактически завершены» «Работы завершены»

5.5.2. Получение заключения

Вид вкладки представлен на рисунке 12.

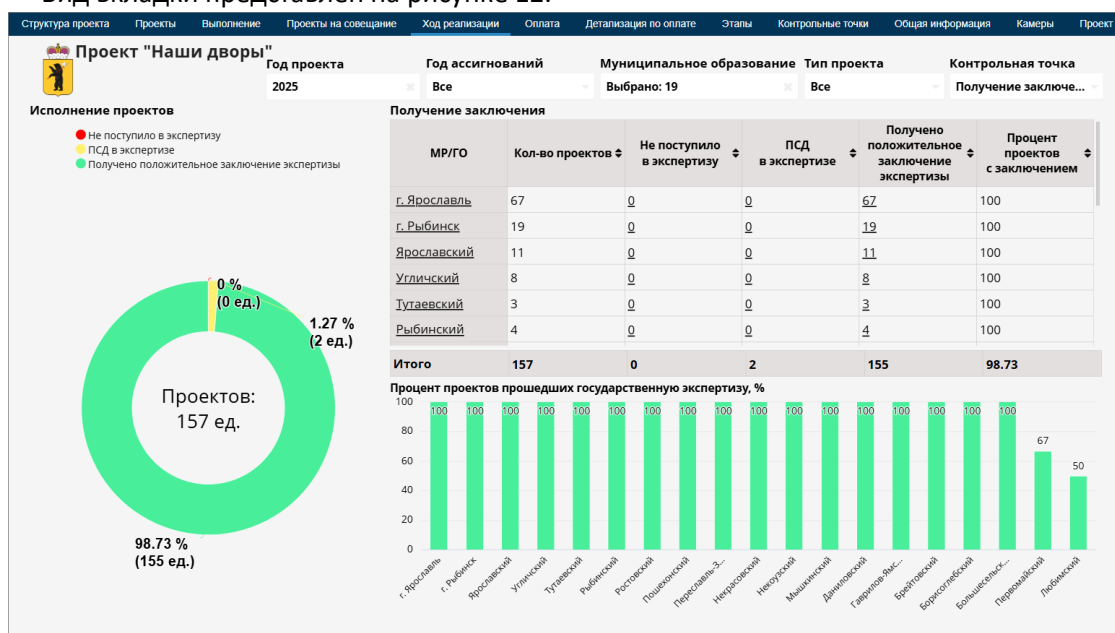


Рисунок 12 – Вкладка «Ход реализации». Получение заключения

Элементы вкладки:

- Диаграмма «Исполнение проектов»;

- Таблица «Получение заключения»;
 - Диаграмма «Процент проектов, прошедших государственную экспертизу, %».
- Описание таблицы «Получение заключения» указано в таблице.

Таблица 6

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МО/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Не поступило в экспертизу	Количество проектов на этапах «ПСД в разработке» «ПСД разработана»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	ПСД в экспертизе	Количество проектов на этапе «ПСД на экспертизе»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Получено положительное заключение экспертизы	Количество проектов на этапах «ПСД разработана» «ПСД на экспертизе» «Получено положительное заключение экспертизы» «Документы направлены в ДГЗ/ЦКПМ» «Объявлены конкурсные процедуры» «Повторные конкурсные процедуры» «Закупка не состоялась» «Закупка состоялась» «Заключен муниципальный контракт» «Ведутся работы» «Работы фактически завершены» «Работы завершены»	Переход на вкладку «Выполнение»
6	Процент проектов с заключением	$[5]/[2]*100\%$	

Диаграмма «Процент проектов, прошедших государственную экспертизу, %» содержит сведения по колонке «Процент проектов с заключением» таблицы «Разработка ПСД».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Получение экспертизы». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице.

Таблица 7

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	$[2]+[3]+[4]$
2	Не поступило в экспертизу	См. Таблица 6, п. 3
3	ПСД в экспертизе	См. Таблица 6, п. 4
4	Получено положительное заключение экспертизы	См. Таблица 6, п. 5

5.5.3. Конкурсные процедуры

Вид вкладки представлен на рисунке 13.

Элементы вкладки:

- Диаграмма «Конкурсные процедуры»;
- Таблица «Конкурсные процедуры»;
- Диаграмма «Процент конкурсных процедур в разрезе МО, %».

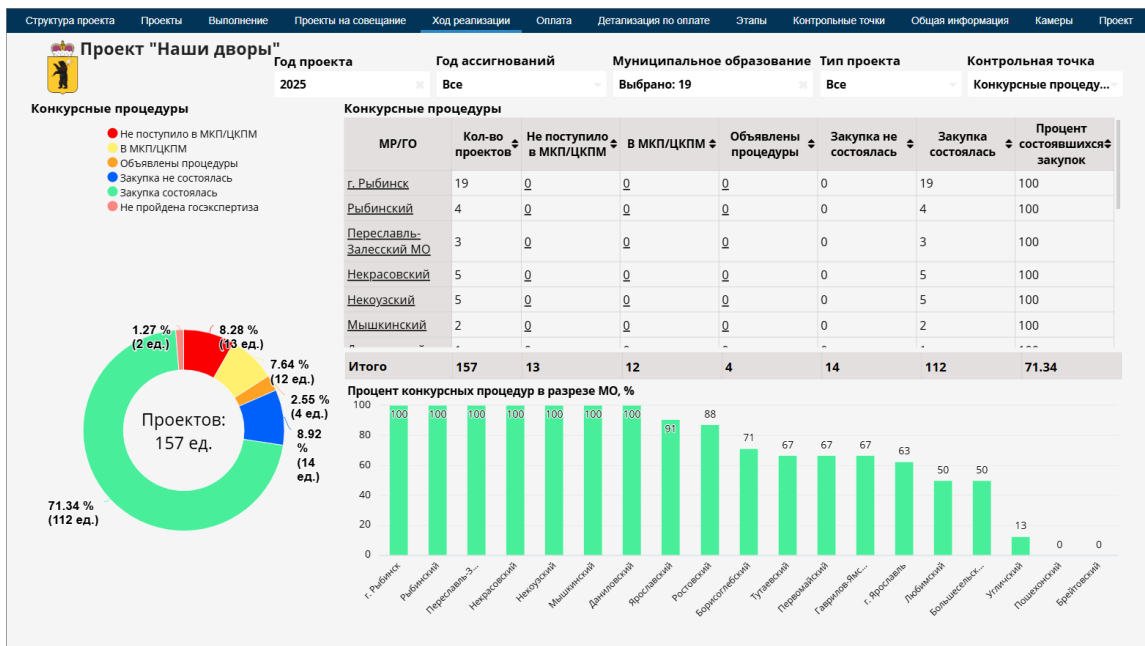


Рисунок 13 – Вкладка «Ход реализации». Конкурсные процедуры

Описание таблицы «Конкурсные процедуры» указано в таблице.

Таблица 7

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МО/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Не поступило в МКП/ЦКПМ	Количество проектов на этапах «ПСД разработана» «ПСД на экспертизе» «Получено положительное заключение экспертизы»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	В МКП/ЦКПМ	Количество проектов на этапах «Документы направлены в ДГЗ/ЦКПМ»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Объявлены процедуры	Количество проектов на этапах «Объявлены конкурсные процедуры» «Повторные конкурсные процедуры»	Переход на вкладку «Выполнение»
6	Закупка не состоялась	Количество проектов на этапах «Закупка не состоялась»	
7	Закупка состоялась	Количество проектов на этапах «Закупка состоялась» «Заключен муниципальный контракт» «Ведутся работы»	

		«Работы фактически завершены» «Работы завершены»	
8	Процент состоявшихся закупок	$[7]/[2]*100\%$	

Диаграмма «Процент конкурсных процедур в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент состоявшихся закупок» таблицы «Конкурсные процедуры».

Диаграмма «Конкурсные процедуры» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Конкурсные процедуры». Структура диаграммы «Конкурсные процедуры» указана в таблице.

Таблица 8

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	См. Таблица 7, п. 2, $[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]$
2	Не поступило в МКП/ЦКПМ	См. Таблица 7, п. 3
3	В МКП/ЦКПМ	См. Таблица 7, п. 4
4	Объявлены процедуры	См. Таблица 7, п. 5
5	Закупка не состоялась	См. Таблица 7, п. 6
6	Закупка состоялась	См. Таблица 7, п. 7
7	Не пройдена госэкспертиза	$[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]$

5.5.4. Заключение контракта

Вид вкладки представлен на рисунке 14.

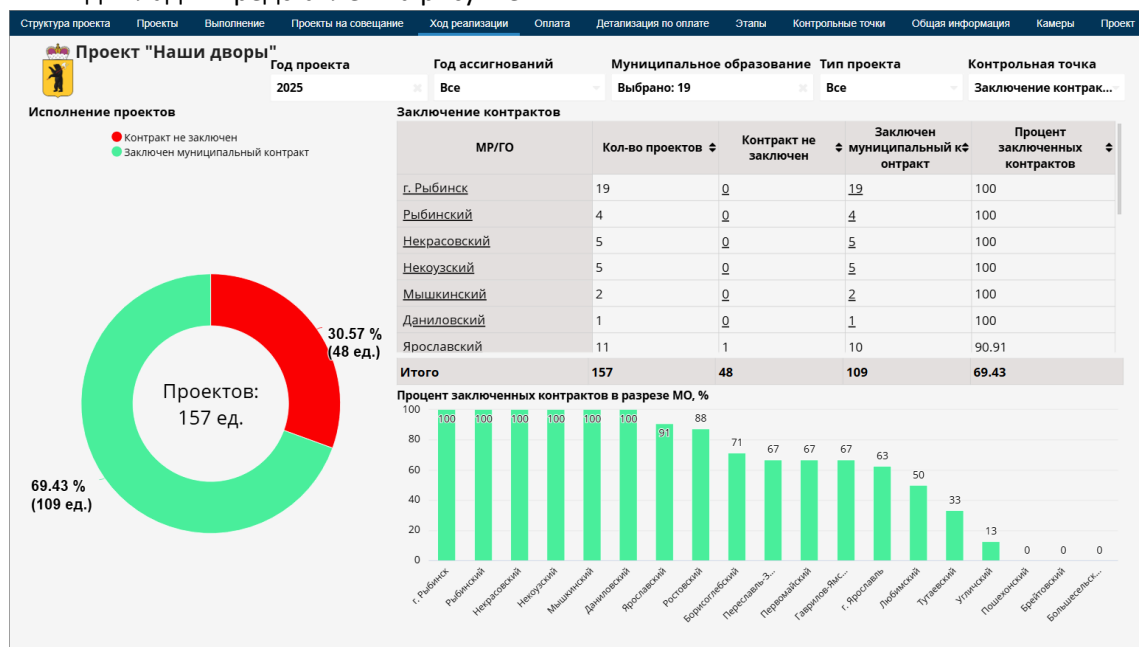


Рисунок 14 – Вкладка «Ход реализации». Заключение контракта

Описание таблицы «Заключение контракта» указано в таблице.

Таблица 9

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
--------	----------------------	-----------	---------------------------

1	МО/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Контракт не заключен	Количество проектов на этапах «ПСД разработана» «ПСД на экспертизе» «Получено положительное заключение экспертизы» «Документы направлены в ДГЗ/ЦКПМ» «Объявлены конкурсные процедуры» «Повторные конкурсные процедуры» «Закупка не состоялась» «Закупка состоялась»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	Заключен муниципальный контракт	Количество проектов на этапах «Заключен муниципальный контракт» «Ведутся работы» «Работы фактически завершены» «Работы завершены»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Процент заключенных контрактов	$[4]/[2] * 100$	

Диаграмма «Процент заключенных контрактов в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент заключенных контрактов» таблицы «Заключение контрактов».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Заключение контрактов». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице.

Таблица 10

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	$[2]+[3]$
2	Контракт не заключен	См. Таблица 9, п. 3
3	Заключен муниципальный контракт	См. Таблица 9, п. 4

5.5.5. Выполнение работ

Вид вкладки представлен на рисунке 15.

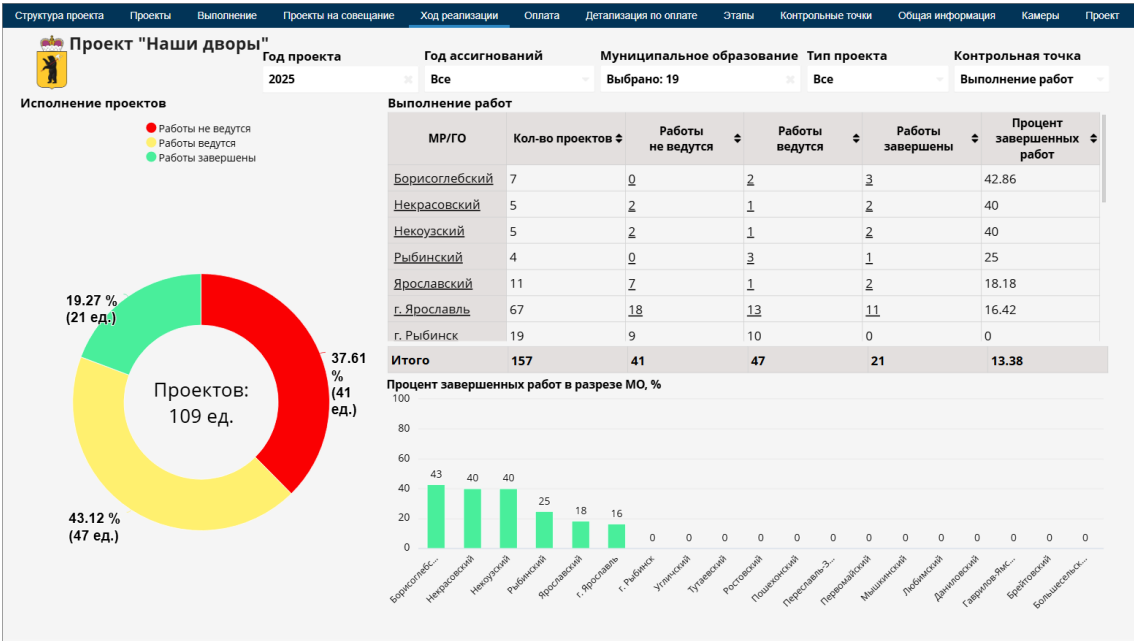


Рисунок 15 – Вкладка «Ход реализации». Заключение контракта

Описание таблицы «Выполнение работ» указано в таблице.

Таблица 11

№ п.п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МО/ГО	Наименование муниципального образования	Переход на вкладку «Выполнение»
2	Кол-во проектов	Общее количество проектов	
3	Работы не ведутся	Количество проектов на этапах «Заключен муниципальный контракт»	Переход на вкладку «Выполнение»
4	Работы ведутся	Количество проектов на этапах «Ведутся работы»	Переход на вкладку «Выполнение»
5	Работы завершены	Количество проектов на этапах «Работы фактически завершены» «Работы завершены»	Переход на вкладку «Выполнение»
6	Процент завершенных работ	$[5]/[2] * 100$	

Диаграмма «Процент завершенных работ в разрезе МО, %» содержит сведения по колонке «Процент заключенных контрактов» таблицы «Выполнение работ».

Диаграмма «Исполнение проектов» визуализирует значения показателей в итоговой строке таблицы «Выполнение работ». Структура диаграммы «Исполнение проектов» указана в таблице.

Таблица 12

№ п.п.	Наименование показателя	Пояснение
1	Итого	$[2]+[3]+[4]$
2	Работы не ведутся	См. Таблица 11, п. 3
3	Работы ведутся	См. Таблица 11, п. 4
4	Работы завершены	См. Таблица 11, п. 5

5.6. Вкладка «Оплата»

Вкладка предназначена для отображения сведений по стоимостным показателям и кассовому исполнению (Рисунок 16).

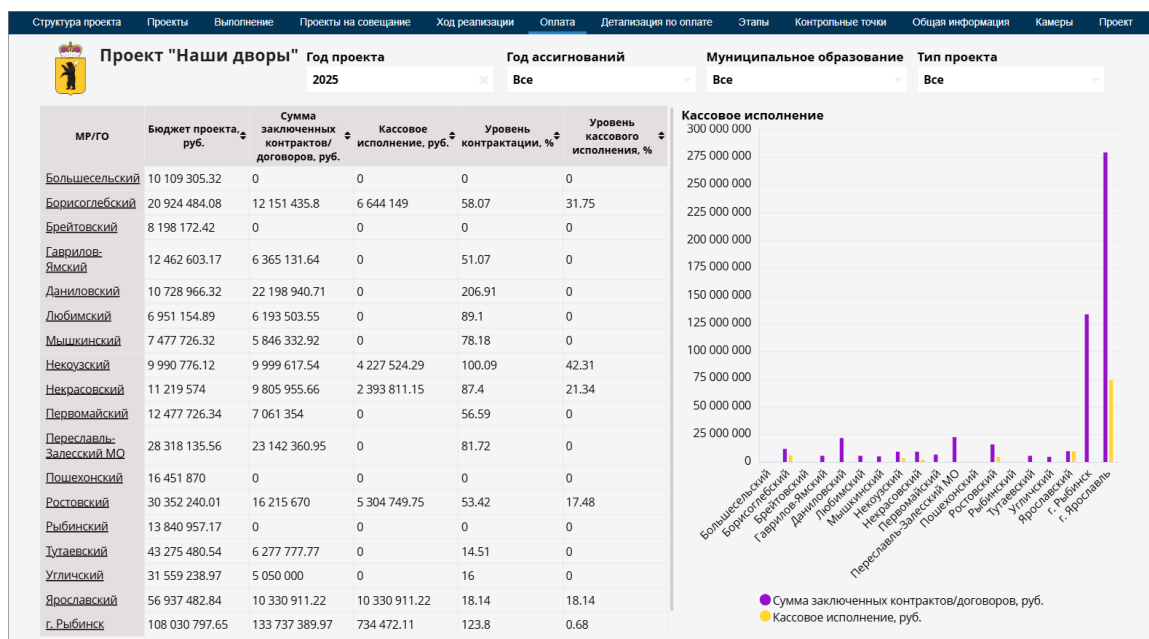


Рисунок 16 – Вкладка «Оплата»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Год ассигнований», «Муниципальное образование», «Тип проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 4.1.

Элементы вкладки:

- Таблица по стоимостным показателям в разрезе муниципальных образований;
- Диаграмма «Кассовое исполнение».

Таблица предназначена для отображения сведений по выполнению проектов. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на наименовании МО/ГО на вкладку «Детализация по оплате» для просмотра детализированной информации - сведений по проектам.

Диаграмма «Кассовое исполнение» предназначена для отображения показателей «Сумма заключенных контрактов/договоров, руб.» и «Кассовое исполнение, руб.» по муниципальным образованиям.

5.7. Вкладка «Детализация по оплате»

Вкладка предназначена для отображения сведений по стоимостным показателям по проектам (Рисунок 17).

Структура проекта	Проекты	Выполнение	Проекты на совещание	Ход реализации	Оплата	Детализация по оплате	Этапы	Контрольные точки	Общая информация	Камеры	Проект
 Проект "Наши дворы" Год проекта: 2025 Год ассигнований: Все Муниципальное образование: Все Тип проекта: Все											
Детализация по оплате											Количество записей: 157
Код Проекта	Проект	МР/ГО	Год выполнения	Тип проекта	Этап выполнения проекта	Процент выполнения проекта	Бюджет проекта, руб.	Сумма заключенных контрактов/договоров, руб.	Кассовое исполнение, руб.	Уровень контрактации, %	
1836	Благоустройство дворовой территории. Большесельск... р-н, с. Большое Село, ул. Сурикова, 10 и 16	Большесельский	2025	Благоустройство дворовой территории	Объявлены конкурсные процедуры	0	7 477 726,32				
1962	Благоустройство отдельной спортивно-игровой площадки. Большесельск... р-н, с. Большое Село, ул. Сурикова, 20, 26, 30	Большесельский	2025	Благоустройство отдельной спортивно-игровой площадки	Закупка состоялась	0	2 631 579				
1576	Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки	Борисоглебский	2025	Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки	Работы завершены	100	3 343 933	3 343 933	3 343 933	100	100

Рисунок 17 – Вкладка «Детализация по оплате»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Год ассигнований», «Муниципальное образование», «Тип проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 4.1.

Элементы вкладки:

- Таблица «Детализация по оплате».

Таблица предназначена для отображения сведений по оплате по проектам. Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации - сведений по проекту.

Вкладка может быть использована и как основная, и как детализация для вкладки «Оплата». В случае перехода из основных вкладок для отображения сведений применяются фильтры основных вкладок.

5.8. Вкладка «Этапы»

Вкладка предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе этапов и муниципальных образований (Рисунок 18).

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Год ассигнований», «Муниципальное образование», «Этап проекта», «Тип проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 4.1.

Элементы вкладки:

- Таблица «Этапы выполнения проектов»;
- Диаграмма «Количество проектов по этапу».

Диаграмма «Этапы» предназначена для отображения процентного соотношения проектов, находящихся на определенном этапе выполнения. При наведении мыши на область этапа отображаются сведения о количестве проектов. Для управления диаграммой используются фильтры «Год проекта», «Год ассигнований», «Муниципальное образование», «Тип проекта».

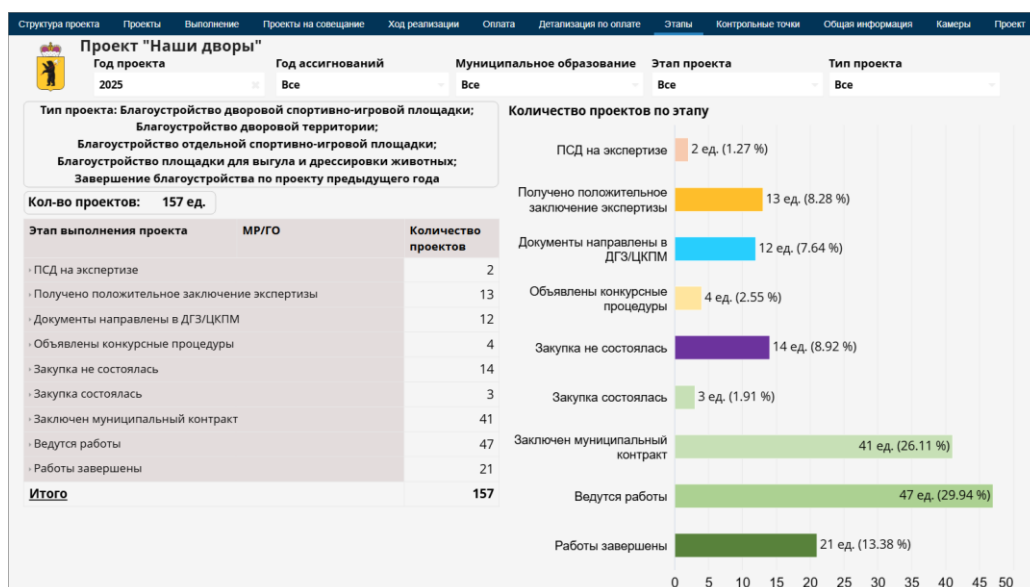


Рисунок 18 – Вкладка «Этапы»

Таблица предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе этапов и муниципальных образований. Для управления таблицей используются все фильтры.

Для просмотра значений показателей по этапу в разрезе МР/ГО необходимо «раскрыть» этап, нажав на наименования этапа.

Этап выполнения проекта	МР/ГО	Количество проектов
ПСД на экспертизе		2
Получено положительное заключение экспертизы	Борисоглебский	2
	Тутаевский	1
	г. Ярославль	10
Документы направлены в ДГЗ/ЦКПМ		12
Объявлены конкурсные процедуры		4
Закупка не состоялась		14
Закупка состоялась		3
Заключен муниципальный контракт		41
Ведутся работы		47
Работы завершены		21
Итого		157

Рисунок 19 – Вкладка «Этапы». Просмотр значений показателей по МО/ГО

Для раскрытия таблицы по всем этапам необходимо по правой кнопке мыши вызвать меню, указать «Раскрыть все» (Рисунок 20).

Этап выполнения проекта	МР/ГО	Количество проектов
· ПСД на экспертизе		2
· Получено положительное заключение экспертизы		13
· Документы направлены в ДГЗ/ЦКПМ	Раскрыть все Свернуть все Раскрыть все строки Свернуть все строки	12
· Объявлены конкурсные процедуры		4
· Закупка не состоялась		14
· Закупка состоялась		3
· Заключен муниципальный контракт		41
· Ведутся работы		47
· Работы завершены		21
Итого		157

Рисунок 20 – Вкладка «Этапы». Просмотр значений показателей по МО/ГО

Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на наименовании МО/ГО на вкладку «Выполнение» для просмотра детализированной информации - сведений по выполнению проектов.

5.9. Вкладка «Контрольные точки»

Вкладка предназначена для отображения сведения по этапам выполнения проекта в разрезе муниципальных образований (Рисунок 21).

Структура проекта Проекты Выполнение Проекты на совещание Ход реализации Оплата Детализация по оплате Этапы Контрольные точки Общая информация Камеры Проект																		
Проект "Наши дворы" Год проекта: 2025 Год ассигнований: Все Муниципальное образование: Выбрано: 19 Тип проекта: Все Контрольная точка: Запланирован к выполнению Тип проекта: Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки; Благоустройство дворовой территории; Благоустройство отдельной спортивно-игровой площадки; Благоустройство площадки для выгула и дрессировки животных; Завершение благоустройства по проекту предыдущего года																		
МР/ГО	Ед.	Заплани- рован	ПСД в разработке	ПСД разработана	ПСД на экспертизе	Получено заключение	ДГЗ/ ЦКПМ	Объявлены процедуры	Повторные процедуры	Закупка не состоялась	Закупка состоялась	Заключен контракт	Ведутся работы	Фактически завершено	Работы завершены	Ед. по контр. точке	% по контр. точке	
г. Ярославль	67	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	18	13	0	11	67	100	
г. Рыбинск	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0	19	100	
Ярославский	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	1	0	2	11	100	
Угличский	8	0	0	0	0	0	3	1	0	3	0	1	0	0	0	8	100	
Тутаевский	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	100	
Рыбинский	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4	100	
Ростовский	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	8	100	
Пошехонский	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	
Переславль- Залесский МО	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	100	
Первомайский	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	100	
Некрасовский	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	5	100	
Некоузский	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	5	100	
Мышкинский	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	100	
Любимский	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	100	
Даниловский	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100	
Гаврилово- Ярский	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	100	
Брейтовский	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	100	
Борисоглебский	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3	7	100	
Большесельский	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	100	
Итого	157	0	0	0	2	13	12	4	0	14	3	41	47	0	21	157	100	

Рисунок 21 – Вкладка «Контрольные точки»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Год ассигнований», «Муниципальное образование», «Тип проекта», «Контрольная точка» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 4.1.

Таблица содержит сведения о количестве проектов, находящихся на этапе и о прохождении выбранного этапа (контрольной точке). Предусмотрена сортировка по значению в колонке таблицы. Предусмотрен переход по ссылке на значении в таблице на вкладку «Выполнение».

Таблица 13

№ п. п.	Наименование колонки	Пояснение	Переход на другую вкладку
1	МО/ГО		«Выполнение»
2	Ед.	Общее количество проектов	
3	Запланирован	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
4	ПСД в разработке	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
5	ПСД разработана	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
6	ПСД на экспертизе	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
7	Получено заключение	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
8	ДГЗ/ЦКПМ	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
9	Объявлены процедуры	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
10	Повторные процедуры	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
11	Закупка не состоялась	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
12	Закупка состоялась	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
13	Заключен контракт	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
14	Ведутся работы	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
15	Фактически завершено	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
16	Работы завершены	Количество проектов на соответствующем этапе	«Выполнение»
17	Ед. по контрольной точке	См. Таблица 14	
18	% по контрольной точке	[17]/[2] *100%	

В таблице 14 указаны контрольные точки для вкладки.

Таблица 14

№ п. п.	Наименование точки	Пояснение
1	Запланирован к выполнению	Количество проектов на этапах [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]+[9] +[10]+[11]+[12]+[13]+[14]
2	ПСД в разработке	Количество проектов на этапах [2]
3	ПСД разработана	Количество проектов на этапах [3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]+[9] +[10]+[11]+[12]+[13]+[14]
4	ПСД на экспертизе	Количество проектов на этапах [4]+[5]+[6]+[7]+[8]+[9] +[10]+[11]+[12]+[13]+[14]
5	Получено положительное заключение экспертизы	Количество проектов на этапах [5]+[6]+[7]+[8]+[9] +[10]+[11]+[12]+[13]+[14]

6	Документы направлены в ДГЗ/ЦКПМ	Количество проектов на этапах [6]+[7]+[8]+[9] +[10]+[11]+[12]+[13]+[14]
7	Объявлены конкурсные процедуры	Количество проектов на этапах [7]+[8]+[9] +[10]+[11]+[12]+[13]+[14]
8	Повторные конкурсные процедуры	Количество проектов на этапах [8]
9	Закупка не состоялась	Количество проектов на этапах [9]
10	Закупка состоялась	Количество проектов на этапах [10]+[11]+[12]+[13]+[14]
11	Заклучен муниципальный контракт	Количество проектов на этапах [11]+[12]+[13]+[14]
12	Ведутся работы	Количество проектов на этапах [12]+[13]+[14]
13	Работы фактически завершены	Количество проектов на этапах [13]+[14]
14	Работы завершены	Количество проектов на этапах [14]

5.10. Вкладка «Общая информация»

Вкладка предназначена для отображения сведений по количеству проектов в разрезе муниципальных образований (Рисунок 22).

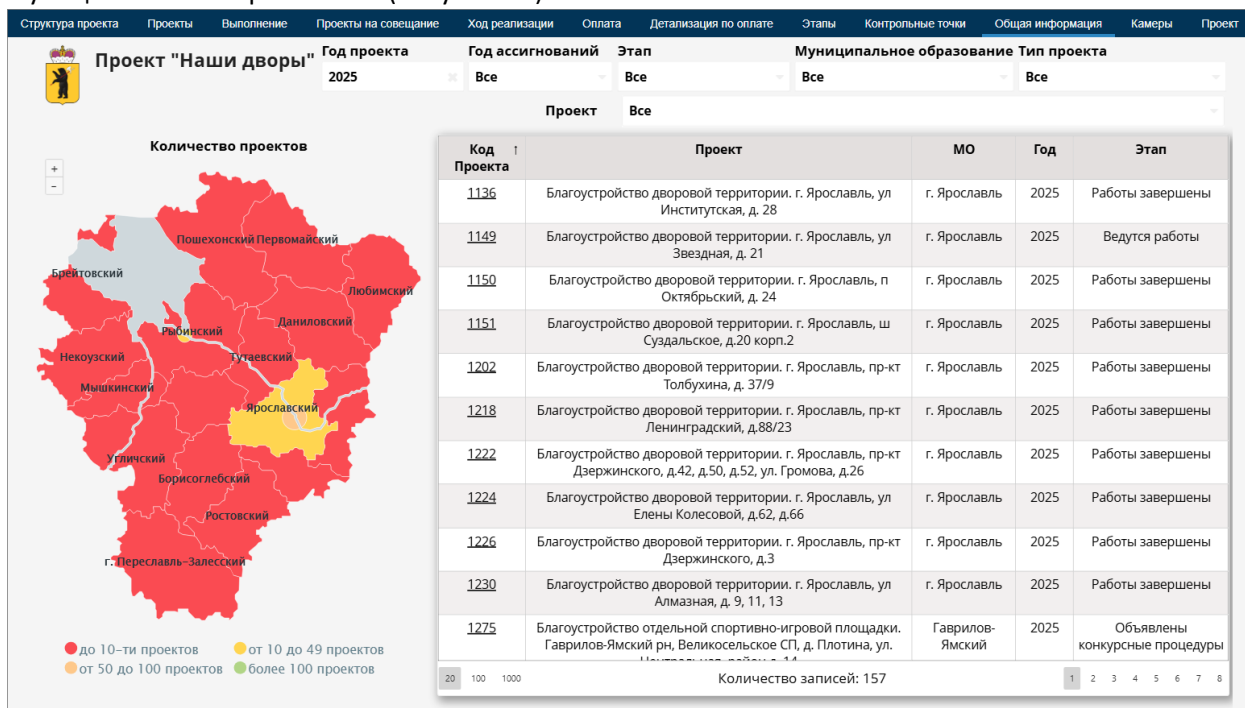


Рисунок 22 – Вкладка «Общая информация»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Год ассигнований», «Этап», «Муниципальное образование», «Тип проекта», «Проект» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 4.1.

Фильтр «Проект» предназначен для поиска проекта по наименованию (Рисунок 23). Для того, чтобы найти проект по наименованию, необходимо раскрыть фильтр, в строке поиска указать часть наименования, указать «выбрать отображаемые» элементы или указать галочкой подходящие, нажать кнопку «Применить».

Проект: Все

Выбранные значения: Кооперативная

Благоустройство: ВЫБРАТЬ ОТОБРАЖАЕМЫЕ СНЯТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ

Благоустройство: Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки. Большесельский район, с Большое Село, ул Кооперативная, д. 35-д.37.

Благоустройство: Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки. г. Переславль-Залесский, ул 50 лет Комсомола, д. 2, д. 4, ул Кооперативная, д. 64, д. 66, д. 68

Благоустройство: Благоустройство дворовой территории. Большесельский район, с Большое Село, ул Кооперативная д.35-37

ОТМЕНА ПРИМЕНИТЬ

Рисунок 23 – Вкладка «Общая информация». Поиск по наименованию

Элементы вкладки:

- Диаграмма «Количество проектов»;
- Таблица со списком проектов.

Диаграмма «Количество проектов» предназначена для отображения данных по количеству проектов по муниципальным образованиям на карте региона. При наведении мыши на область муниципального образования отображается значение показателя.

Таблица предназначена для отображения сведений по проектам. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на код проекта вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации - сведений по проекту.

5.11. Вкладка «Камеры»

Вкладка предназначена для отображения сведений по проекту (Рисунок 24).

Структура проекта | Проекты | Выполнение | Проекты на совещание | Ход реализации | Оплата | Детализация по оплате | Этапы | Контрольные точки | Общая информация | **Камеры** | Проект

Проект "Наши дворы" Год проекта: 2025 Муниципальное образование: Все Этап: Все Тип проекта: Все

Всего объектов: 157 Оснащены СВН: 2 Не оснащены: 155

Код проекта: Все Наименование проекта: Все Адрес проекта: Все Наличие потока с камер: Все

Система видеонаблюдения (СВН) на объектах Количество объектов: 157

Код проекта	Наименование проекта	Адрес места реализации	Кол-во камер	Кол-во работающих камер	Кол-во неработающих камер	Ссылка на камеру1
1836	Благоустройство дворовой территории. Большесельский р-н, с. Большое Село, ул. Сурикова, 10 и 16	Большесельский р-н, с. Большое Село, ул. Сурикова, 10	0	0	0	
1962	Благоустройство отдельной спортивно-игровой площадки. Большесельский р-н, с. Большое Село, ул. Сурикова, 20, 26, 30	Большесельский р-н, с. Большое Село, ул. Сурикова, 20	0	0	0	
1576	Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки. Борисоглебский р-н, рп. Борисоглебский, ул. Лагерная, 52	Борисоглебский р-н, рп. Борисоглебский, ул. Лагерная, 52	0	0	0	
1577	Благоустройство отдельной спортивно-игровой площадки. Борисоглебский р-н, с. Вожажниково, ул. Советская	Борисоглебский р-н, с. Вожажниково, ул. Советская	0	0	0	
1949	Благоустройство дворовой территории. Борисоглебский р-н, с. Покровское, ул. Советская	Борисоглебский р-н, с. Покровское, ул. Советская	0	0	0	

Рисунок 24 – Вкладка «Камеры»

В верхней части вкладки размещены фильтры «Год проекта», «Этап», «Муниципальное образование», «Тип проекта» для отображения данных. Работа с фильтрами описана в п. 4.1.

Элементы вкладки:

- Показатели «Всего объектов», «Оснащены СВН», «Не оснащены СВН»;
- Диаграмма оснащения объектов СВН;

- Таблица «Система видеонаблюдения (СВН) на объектах». Сведения по показателям отображены в таблице

Таблица 15

№ п. п.	Наименование точки	Пояснение
1	Всего объектов	Количество проектов на этапе «Ведутся работы»
2	Оснащены СВН	Количество проектов на этапе «Ведутся работы», по которым указаны камеры
3	Не оснащены	Количество проектов на этапе «Ведутся работы», по которым не указаны камеры

Для управления отображением объектов в таблице «система видеонаблюдения на объектах» предусмотрены дополнительные фильтры: «Код проект», «Наименование проекта», «Адрес проекта», «Наличие потока с камер». Предусмотрена сортировка по значениям в колонках таблицы. Предусмотрен переход из таблицы по ссылке на код проекта на вкладку «Проект» для просмотра детализированной информации - сведений по выбранному проекту и контрактам.

5.12. Вкладка «Проект»

Вкладка предназначена для отображения сведений по проекту (Рисунок 25).

Структура проекта | Проекты | Выполнение | Проекты на совещание | Ход реализации | Оплата | Детализация по оплате | Этапы | Контрольные точки | Общая информация | Камеры | Проект

Проект "Наши дворы" Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки. Борисоглебский р-н, рп. Борисоглебский, ул. Лагерная, 52. Код проекта 1576

Место реализации: Борисоглебский р-н, рп. Борисоглебский, ул. Лагерная, 52. Год проекта 2025. Год ассигнований 2025. МР / ГО Борисоглебский

Тип проекта: Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки

Ожидаемые результаты: Устройство травмобезопасного покрытия площадью 168,0 кв.м., устройство ограждения площадки 196,4 п.м., установка информационного щита, установка диванов на металлических ножках -

Этап: Работы завершены. Планируемая дата окончания: 01.03.2025. Фактическая дата окончания: 31.10.2024. Процент выполнения: 100. Ед. техники: Рабочих.

Ссылка на Геопортал: <https://gis76.ru/map?c=57.81093163425472.40.21150..>

Предусмотрено БА			Контракты				
ФБ	ОБ	МБ	Подрядчик	Контракт	Сумма контракта, руб.	Сумма по акту, руб.	Дата акта
-	3176736.35	167196.65	ООО фирма "Резгор"	65. 21.08.2024	3343933	3343933	31.10.2024
Освоено БА	3343933	0					

Контрольные точки		
Статус	Дата план	Дата Факт
ПСД разработана	10.12.2024	13.05.2024
Получено положительное заключение экспертизы	01.03.2025	10.06.2024
Заключен муниципальный контракт	01.04.2025	21.08.2024
Работы завершены	01.09.2025	31.10.2024

Этап | **Фото**

Фото после реализации

Фото после реализации

Рисунок 25 – Вкладка «Проект»

Вкладка является детализацией для основных вкладок «Выполнение», «Проекты на совещание», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Камеры».

Для того, чтобы просмотреть сведения по проекту, необходимо выполнить следующие действия:

- 1) во вкладке «Выполнение», «Проекты на совещание», «Детализация по оплате», «Общая информация», «Камеры» выбрать проект, воспользовавшись предусмотренными фильтрами;
- 2) перейти по ссылке на «Код проекта» в таблице выбранных проектов на вкладку «Проект».

Для движения по списку фотоматериалов используется прокрутка. Предусмотрена сортировка фотоматериалов по значению «Этап» в таблице фотоматериалов. Для открытия фотоматериала в отдельном окне необходимо выбрать фотоматериал.

Предусмотрен переход по ссылке на Геопортал.

6. Техническая поддержка

Техническая поддержка Подсистемы осуществляется специалистами ГБУ ЯО «Электронный регион» по тел. (4852) 49-09-49, адресу электронной почты: rias_tp@er76.ru и посредством системы поддержки пользователей органов исполнительной власти и местного самоуправления HelpDesk по адресу <https://helpdesk.yarcloud.ru>.

Режим работы службы технической поддержки:

- понедельник – четверг с 8.30 до 17.30;
- пятница и предпраздничные дни с 8.30 до 16.30.

Для удобства и более оперативной обработки обращений, поступивших в адрес технической поддержки, в сообщении необходимо указать тему «СУР. СЦ. Наши дворы», контактные данные заявителя (название организации, ФИО, телефон) и добавить скриншот экрана с ошибкой.
